

04/12/2012

לכבוד,

אלון הרצוג – מנכ"ל קפיטל גרופ.
עידן שמש – קפיטל גרופ.
יעל לוינסון – קפיטל גרופ.
שי קורצמן - וועד מנהל.

אתר: בלפור 58, בת ים.

הנדון: דוח מצב נובמבר 2012

כללי

- היתר בנייה התקבל בתאריך 21.12.11.
- צו התחלת עבודה מתוקן הוא 15.02.12 - בהתחשב בזמן בו התקבל טופס 2.

ביצוע

- ב 26.03.12 הסתיים ביצוע כל כלונסאות הדיפון, סה"כ בוצעו כ 233 כלונסאות דיפון.
- ב 05.03.12 הסתיים ביצוע כל קורות הראש.
- שינוי תכנון בורות ניקוז בעקבות גילוי מי תהום וביצוע בורות וצנרת אינסטלציה במפלס יסודות.
- אינסטלציה : ביצוע כל הצנרות והבורות במפלס היסודות.
- יסודות : ביצוע יסודות בודדים F1,F2,F3,F4,F5,F6 ורפסודה F8.
- שלד מרתף 3- : רצפה וורטיקלי הושלמו.
- שלד מרתף 2- : רצפה וורטיקלי הסתימו.
- שלד מרתף 1- : 3/4 רצפה הסתיימה, עבודה על ורטיקלי של חצי צפוני.

יעדי חודש הבא

- השלמת רצפת וורטיקלי למרתף 1-.
- ביצוע תקרת טרנספורמציה דרוכה במפלס הפיתוח.


בברכה,

רון בן דוד





חזית צפונית - מערבית

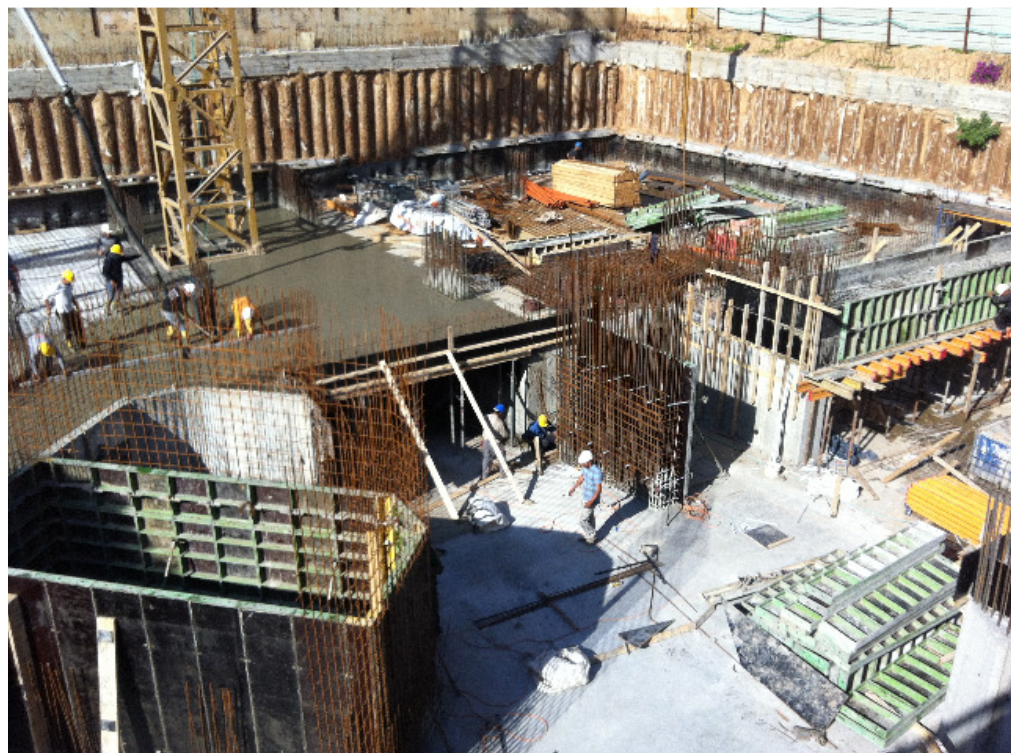

חזית דרומית - מערבית

